



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТП за 2012 г.



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще




ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие




ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.12.2012 г.

- ✓ Договорени средства – 82 101 043,92 лв. или **73,88 %**
- ✓ Реално изплатени средства – 37 812 367,62 лв. - **34,03 %**
- ✓ Сертифицирани средства – 25 318 629,10 лв. – **22,78 %**

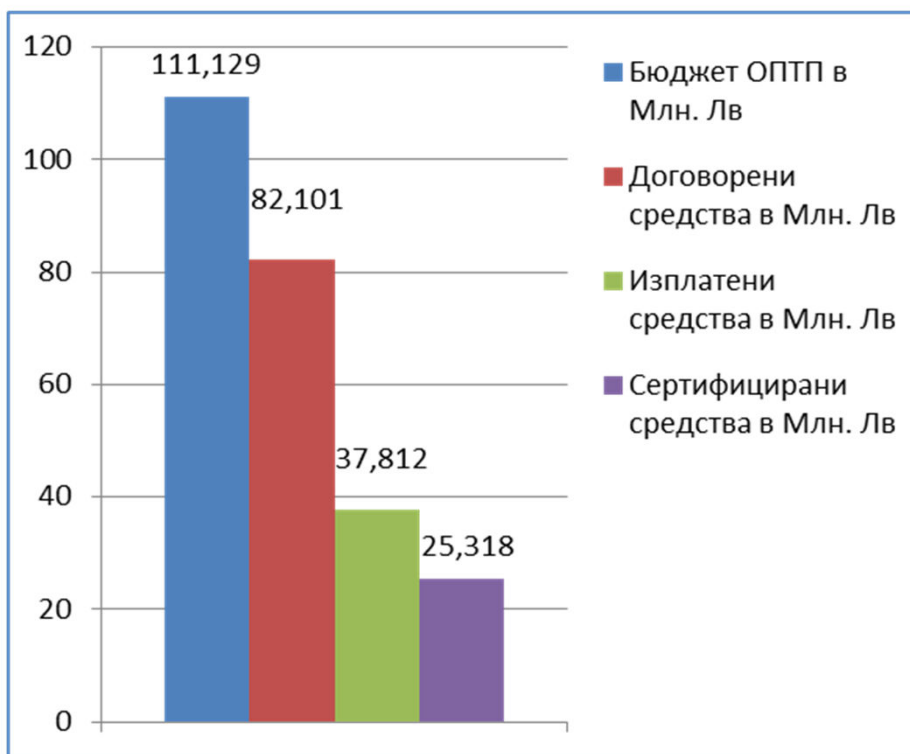


Изпълнение на ОПТП в лв.

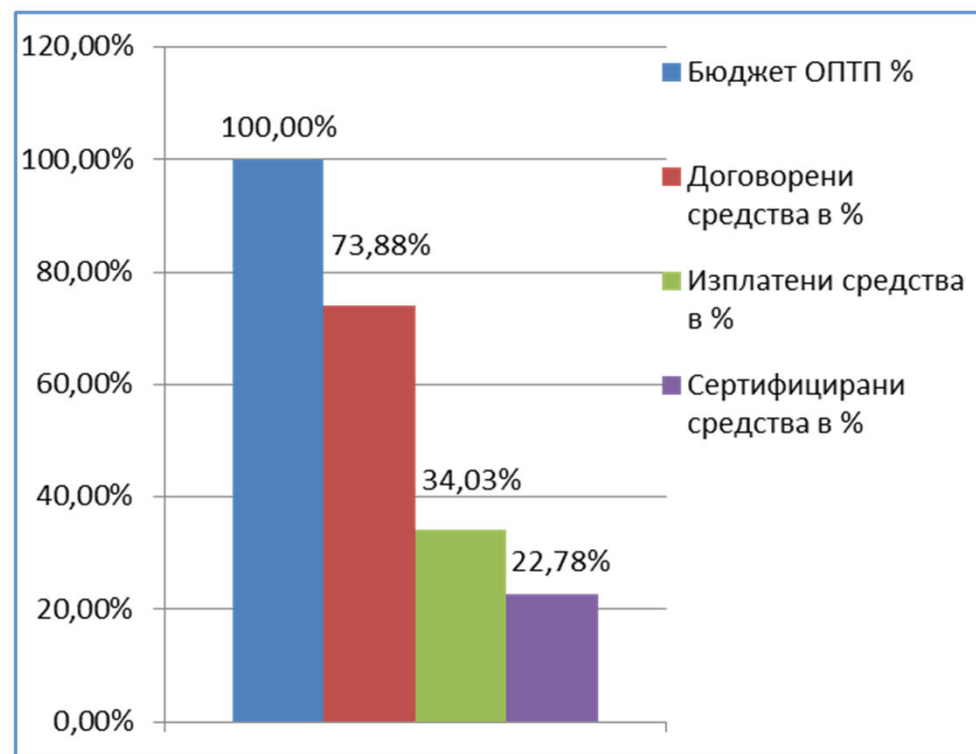

Изпълнение в процентно съотношение

ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.12.2012 г.


ПО 1 „Подпомагане реализирането на дейностите на структурите на централно и местно ниво. Мерки за изграждане на капацитета на институциите, работещи по Структурните фондове“

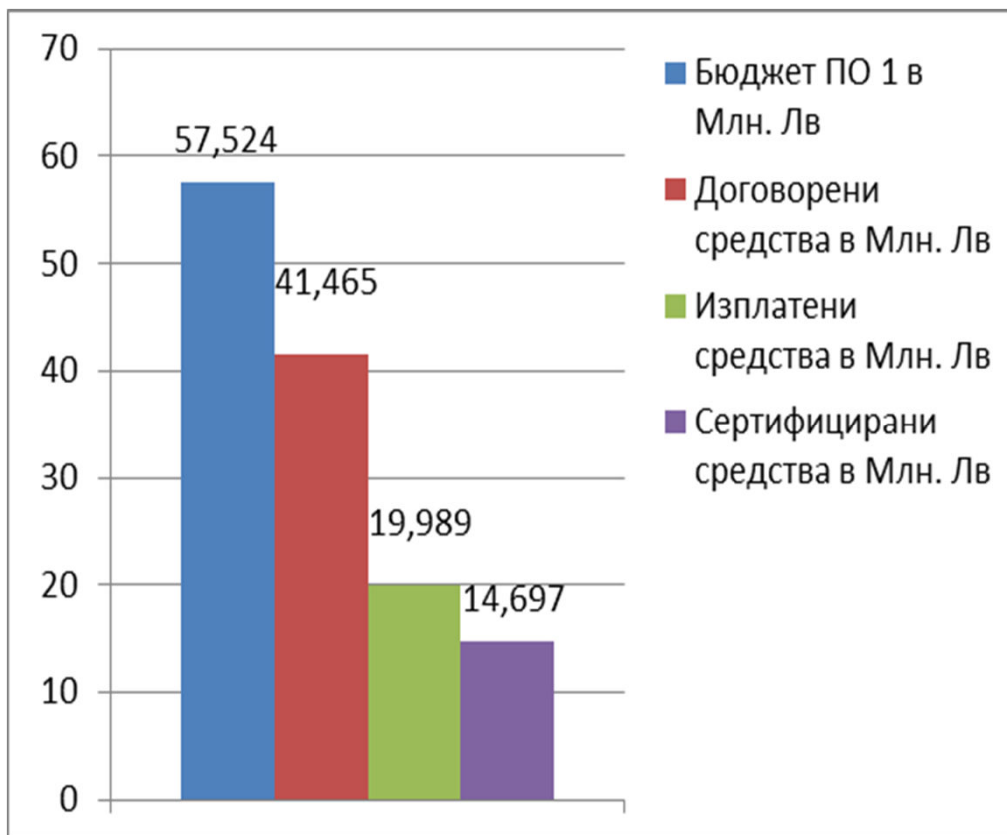

- ✓ Текуществото на персонала сред бенефициентите за 2012 г. е 14,46 %, т.е е намаляло спрямо нивата от 2011 г. (16,33%).
- ✓ Дейности за обучения, семинари, заседания, срещи за обмяна на опит и други подобни мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на централно ниво се изпълняваха успешно и през 2012 г. с висока степен на удовлетвореност (над 90 %).
- ✓ През 2012 г. са проведени и посетени 129 различни обучителни курсове и семинари в областта на регионалната политика на ЕС и управлението на СКФ. Обучени са 296 служители на централната администрация, участващи в процесите по управление, координация и контрол на структурните инструменти в България.

ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.12.2012 г.

ПО 2 “Допълнително разработване и подпомагане на функциите на ИСУН”

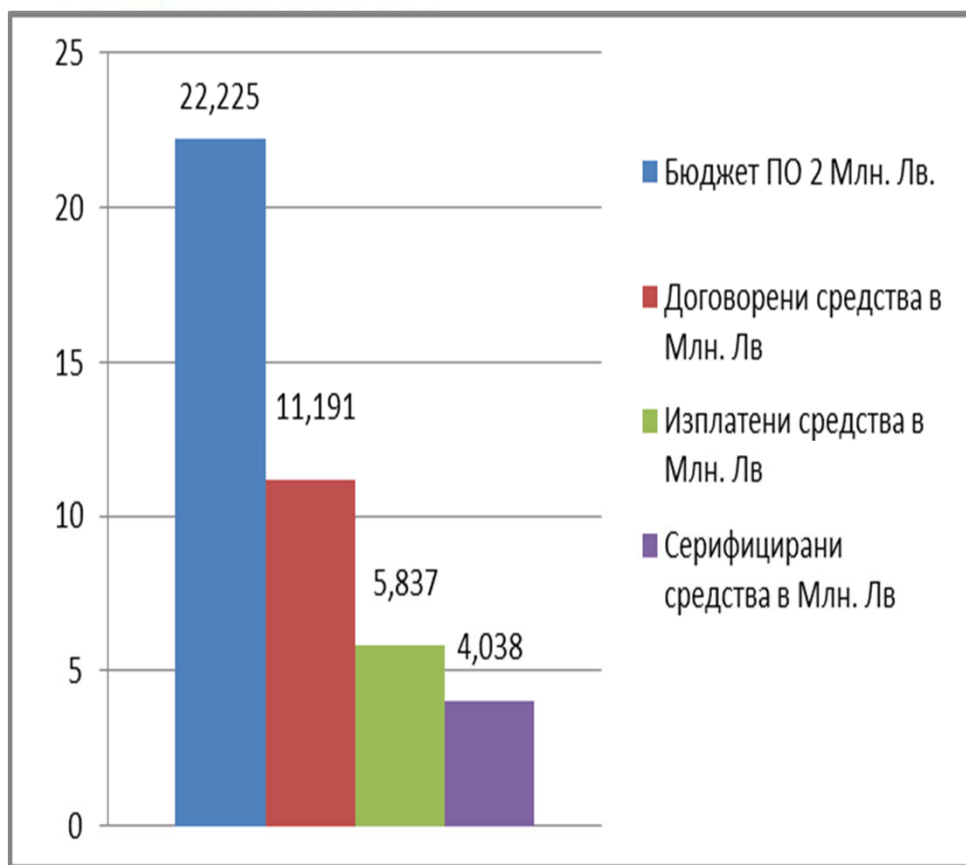


През 2012 г. по приоритетна ос две се изпълняват проектите на бенефициента ЦКЗ:

- „Поддържане и обновяване на информационната среда за работа на ИСУН”;
- „Осигуряване на развитието и функционирането на ИСУН”;
- „Разширяване функционалността на Информационната система за управление и наблюдение средствата от ЕС (ИСУН) чрез разработване и прилагане на Географска информационна система (ГИС)”;

През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН”.

ОБЩ НАПРЕДЪК ПО ОПТП КЪМ 31.12.2012 г.

ПО 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация“

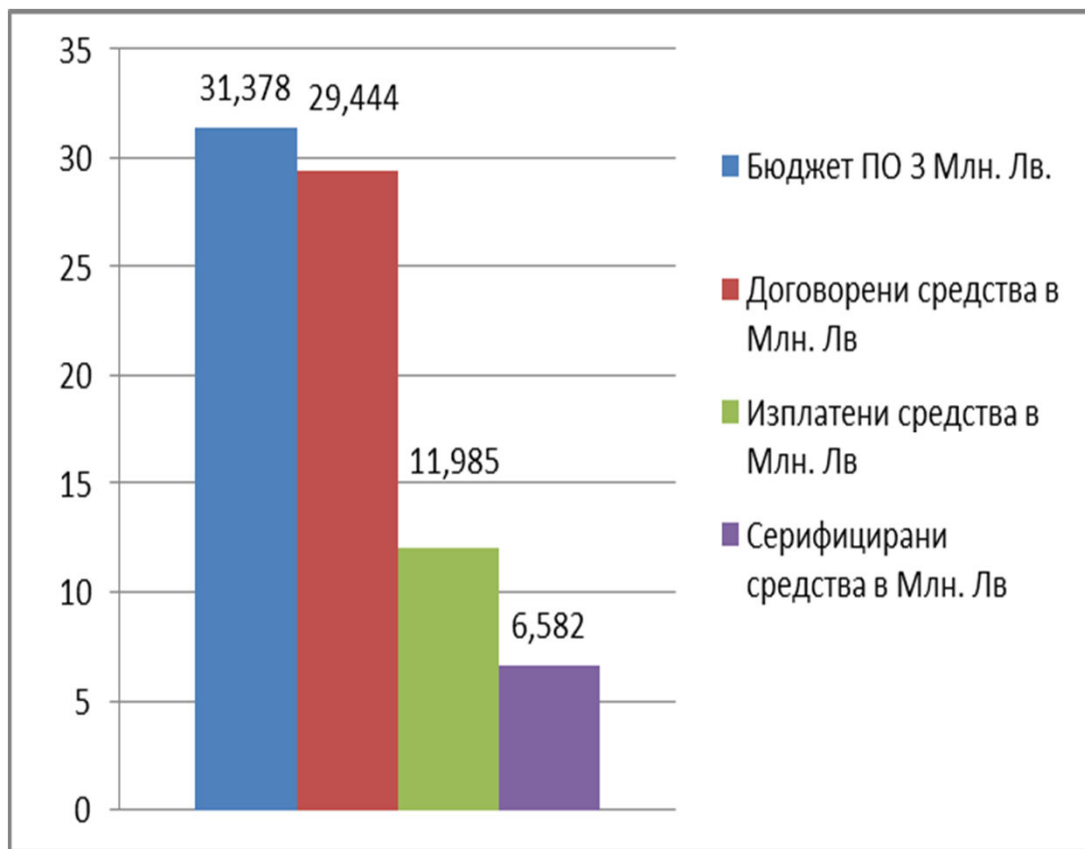

- ✓ През 2012 г. приключи изпълнението на проект на бенефициента ЦКЗ „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България“.
- ✓ През 2012 г. стартира изпълнението на проект на бенефициента ЦКЗ „Документален фонд на оперативните програми“.
- ✓ През 2012 г. стартира и изпълнението на проект на бенефициента ЦИО „Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.“



ИДЕНТИФИЦИРАНИ СЪЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

Организиране и
провеждане на
обществените
поръчки

Повтарящи се
пропуски по
отношение на
отчитането на
разходите

Ненавременно
изпълнение на
дейностите по
проектите

Ускорен процес на предварителен контрол на документациите по обществени поръчки по проекти на ОПТП.

Регулярни срещи с бенефициенти, за обсъждане на проблеми при изпълнение на проектите и възможности за тяхното разрешаване.

Извършени модификации по конкретни проекти с цел оптимизиране на дейностите.

Ускорен процесът на верификация на разходите в УО на ОПТП.

УО на ОПТП изготвя регулярно искания за средства към НФ с оглед ускоряване процеса на възстановяване на средствата към бенефициентите.

- УО на ОПТП идентифицира нов кръг от бенефициенти
- инициира прехвърляне на средства между ПО на програмата.
- По този начин осигурява необходимия финансов ресурс за новите бенефициенти и договаряне на целия ресурс по ОПТП



ОДИТИ И ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

ОДИТИ НА СИСТЕМИТЕ - извършен от ИА "ОСЕС"

Трети системен одит по ОПТП за оценка на Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки“

- ✓ Оценката по целите на одитния ангажимент е 2 „Работи, но са необходими някои подобрения“.
- ✓ 3 констатации и препоръки по тях, от които една със средно и две с ниско ниво на значимост.

Четвъртият системен одит е извършен в периода септември 2012 – януари 2013 г, като докладите (предварителен и окончателен) са изготвени и предоставени на УО на ОПТП през 2013 г.

ОДИТ НА ОПЕРАЦИИТЕ - извършен от ИА "ОСЕС"

Трети одит на операциите за увереност че разходите, декларирани пред ЕК /1.01.2011 – 31.12.2011/ са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни

ПРОВЕРКИ НА МЯСТО НА СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН

Проверки на място на Сертифициращия орган по верифицираните разходи от УО през 2012 г. – констатирани пропуски по прилагането на ЗОП и такива от организационен характер. Наложени финансови корекции и утвърдени изменения в Процедурния наръчник на ОПТП



ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА

ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПТП /ЕДИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КН НА ОПТП - 27.11.2012 г./

1. Прехвърляне на средства между осите на ОПТП, с цел осигуряване на финансов ресурс за изпълнението на проектите по ПО 1:

- Прехвърляне на средства в размер на 7 151 887,77 лв. от ПО 2 в ПО 1;
- Прехвърляне на средства в размер на 1 885 704,45 лв. от ПО 3 в ПО 1.

2. Определяне на допълнителни конкретни бенефициенти по ПО 1 и създаване на нови мерки на подкрепа 10 и 11 за тях:

- Националното сдружение на общините в Република България;
- Дирекция „Финанси на реалния сектор“ в Министерството на финансите;

В програмния документ са отразени необходимите промени.

Искането за изменение на ОПТП е изпратено на 13.02.2013 г. до Европейската комисия чрез системата SFC 2007. Очаква се одобрението от страна на ЕК.



ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ

УО на ОПТП осъществява мониторинг на изпълнението на проектите на базата на регулярно докладване за напредъка от страна на бенефициентите на всяко календарно тримесечие

- ✓Наличие на значителни закъснения и неспособност за реализация на проектите в предвидените срокове;
- ✓Проверката на напредъка по проектите е да се установят своевременно потенциални или възникнали рискове и проблеми,
- ✓Извършени 37 проверки „на място“, при които не са констатирани нередности.
- ✓Извършени общо 16 проверки „на място“ при бенефициенти общини, 12 от които са извършени след приключване на строително монтажните работи в областните информационни центрове.
- ✓Информацията, събрана и проверена от УО на проектно ниво се въвежда в ИСУН.
- ✓Използваната система LOTNAR дава възможност за своевременно предприемане на корективни мерки при проблеми в изпълнението.
- ✓Наблюдението на ОПТП се осъществява в партньорство със Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и с членовете на КН на ОПТП.



ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА

- ✓ 2011 г. стартира изпълнението от УО на проект „Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на ОПТП (проект № 0089-УО-1.4) /в изпълнение изискванията на чл. 48 (1) от Регламент (ЕО) №1083/2006 и Плана за оценка на ОПТП/
- ✓ На 08.08.2012 г. - сключен договор с ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП ЕООД за извършване на средно-срочна оценка на ОПТП /вследствие на проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗОП/
- ✓ На 10.12.2012 г. - предаден проект на окончателен доклад
- ✓ На 21.12.2012 г. - УО изпрати своите коментари
- ✓ В началото на 2013 г. окончателният доклад е одобрен от УО. Той подкрепя иницираните действия от страна на УО за промяна на програмата от месец Ноември 2012 г.



ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

- ✓ **Единен информационен портал www.eufunds.bg** – създадени самостоятелни страници за всеки ОИЦ; създадена информационна среда за обмен на информация между ОИЦ, ЦИКО и ЦИО в реално време; създадена интерактивна административна карта на България с хиперлинкове към 28-те ОИЦ; закупен самостоятелен сървър за хостване на портала; изградена система за управление на банери; създадена секция Social Media Newsroom; нова подстраница „Нов програмен период 2014-2020“; преводи на английската секция; актуализиране на профилите в социалните мрежи facebook, twitter и You Tube;
- ✓ **Информационна мрежа на централно ниво** - Междуведомствена работна група на служителите по информация и публичност на оперативните програми проведе 4 заседания;
- ✓ **Информационна мрежа на местно ниво** - в 27-те ОИЦ в страната, към края на 2012 г., **10 727** посетители са потърсили информация, регистрирани са **10 001** запитвания в мрежата; организирани са **919** информационни събития с **26 381** участници и са направени **5 953** публикации в медиите.
- ✓ **Централен информационен и координационен офис (ЦИКО)** - провел е 8 специализирани обучения, 2 координационни срещи, 5 учебни посещения за обмяна на опит, съответно в Брюксел, Латвия и Полша за служителите в ОИЦ. Служители на ЦИКО са направили над 200 посещения в ОИЦ. Серия от публични представяния на центровете по места съвместно с министъра по управление на средствата от ЕС и представители от ЕК.
- ✓ **Европейски информационни мрежи** - В периода 10 и 11 май 2012 г. във Варшава се проведе Деветата официална среща на членовете на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК – участваха 4 представители от България
- ✓ **Събития:** Близко 70 събития сред които: Второ изложение „Европа за нас“ – 16-18 юни 2012 г.; 3 обучения на бенефициентите по ОПТП, Национален конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град“, Работни посещения на министъра и представители на ЕК в ОИЦ и др.
- ✓ **Комитет за наблюдение на ОПТП (КН на ОПТП):** Десето редовно заседание на КН на ОПТП на 18.06.2012 г. и Единадесето редовно заседание на КН на ОПТП. На 27.11.2012 г.
- ✓ **Комитет за наблюдение на НСРР** - Седмо заседание на 16.11.2012 г.



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
