



ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М М А

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

**“Е-ПОДЕМ – ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ,
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕКТРОНЕН
МЕНЪДЖМЪНТ”**



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Инвестираме във вашето бъдеще




ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие



ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП


Проект №:	0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001
Наименование:	„Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт”
Бенефициент:	Национално сдружение на общините в Република България
Срок:	30 месеца (1.02.2013 г. – 31.07.2015 г.)
Стойност:	7 785 100 лв.




ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/

- ❑ Разработване на електронна система за подготовка и управление на общински проекти, финансирани от СКФ;
- ❑ Цялостно или частично внедряване на системата в минимум 200 общини;
- ❑ Осигуряване на необходимата техника и хардуер за ефективната работа на системата в минимум 200 общини в България;
- ❑ Минимум 350 общински служители, обучени за работа с електронната система;
- ❑ Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен център;
- ❑ Създаване на 8 нови работни места (6 - в Ресурсно-координационния център и 2 в рамките на екипа по управление);

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 22.10.2013 г.




- Проведени са три процедури по ЗОП с предмет:
 - **Доставка на офис-техника и хардуер с 3 обособени позиции**
 - Обособена позиция 1 “Доставка на офис техника и хардуер”
 - ✓ *Избрана е фирма “Контракс” АД за изпълнител на доставката в 251 общини – подписан е договор и доставките са в процес на изпълнение.*
 - Обособена позиция 2 “Доставка на електронни подписи и четци”.
 - ✓ *Избрана е фирма “Борика БанкСервиз” АД за изпълнител на доставката в 221 общини – подписан е договор и са доставени 439 броя електронни подписи и четци.*
 - Обособена позиция 3 “Осигуряване на облачна инфраструктура и услуги в облак” .
 - ✓ *Избрана е фирма “Стоун компютърс” АД за изпълнител и е подписан договор .*



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 22.10.2013 г.

- **Разработване и внедряване на централизирана информационна система за: “Управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ”**
 - Процедурата е проведена и беше избран изпълнител.
 - *Решението за класиране е издадено на 16.08.13 г. и за изпълнител е определен “Технически университет – София – Технологии” ЕООД.*
 - *В законоустановения срок, на 29.08.13 г. в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба от участника “Имеон Софтуер” ООД, което спира влизането в сила на решението на възложителя.*
 - *След извършения фактически и правен анализ и на основание чл. 122г, ал.1, т. 1 от ЗОП, Комисия за защита на конкуренцията оставя жалбата без уважение.*
 - *Изчаква се 14-дневния законоустановен срок за обжалване пред Върховния административен съд.*

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 22.10.2013 г.



- **Организация на форуми и дейности по информация и публичност”**
 - *Избрана е фирма “Бранд ПР” за изпълнител на обществената поръчка:*
 - ✓ *склучен е договор с изпълнителя.*
 - ✓ *реализация на дейностите:*
 - *Национално информационно събитие – над 400 участника от общините.*
 - *изработка на рекламни материали*




УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Настоящият проект е част от системните усилия на НСОРБ през последните години за инвестиране в укрепването на капацитета на общините за подготовка и изпълнение на европейски проекти.

СЛЕД НЕГОВОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, НСОРБ се ангажира да продължи:

- ❖ да развива капацитета на Общинския ресурсно-координационен център – от една страна за подпомагане на общините при подготовка и управление на европейски проекти, а от друга – за подобряване на комуникацията между общините и Управляващите органи;
- ❖ да администрира и да доразвива функционалните характеристики на електронната система за подготовка и управление на европейски проекти (с оглед пълноценното ѝ използване за “без хартиено” кандидатстване и управление на проекти след въвеждането му от Управляващите органи през новия програмен период).

Устойчивостта и надграждането върху постигнатите по проекта резултати ще бъдат постигнати чрез подготовка на нови проектни предложения и чрез осигуряване на собствени средства на НСОРБ и общините.

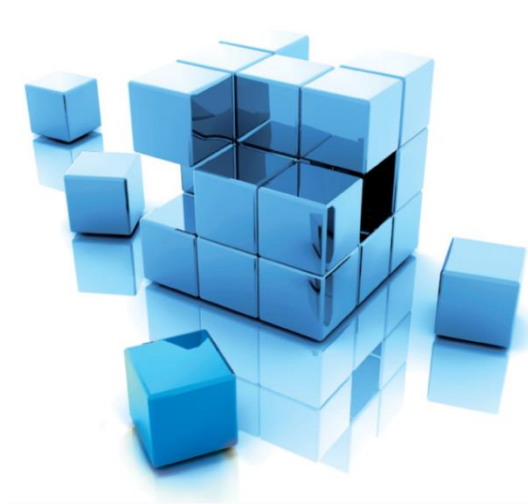

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО
