ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО

КЪМ 1 НОЕМВРИ 2026 г.




Съфинансирано от Европейския съюз

ПРОГРАМА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Финансово изпълнение – програмиране и договаряне

към 01 ноември 2026 г. | в млн. евро | общ бюджет

Разпределение на бюджета на ПТП

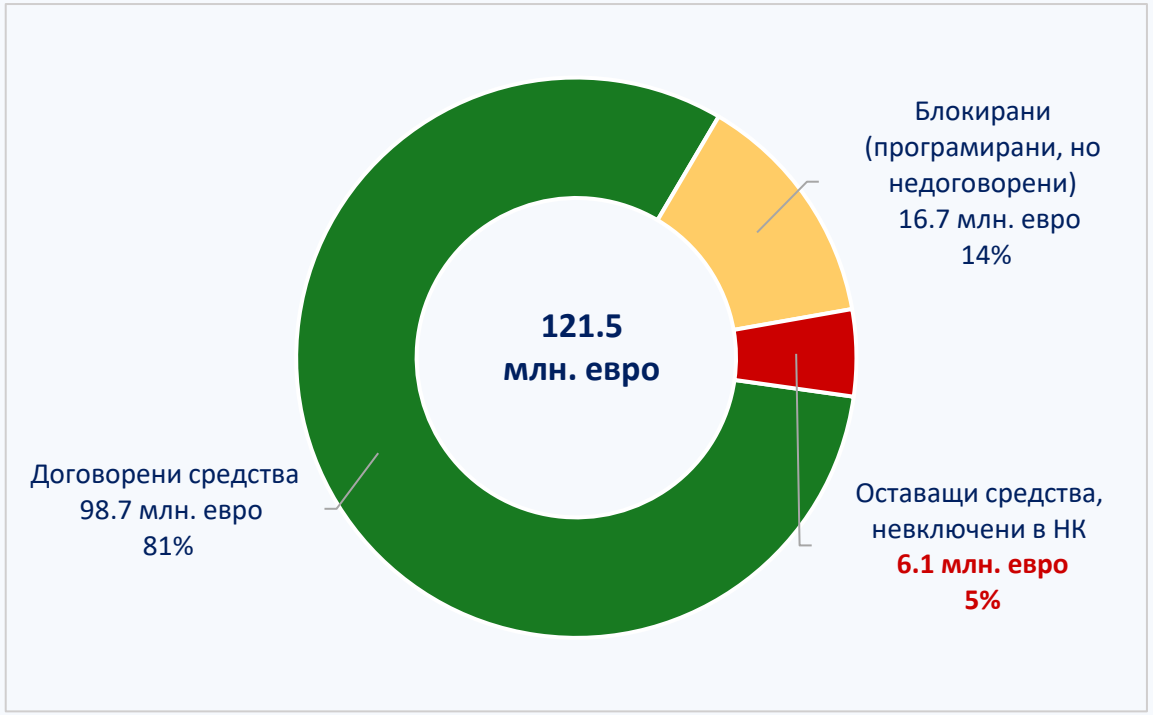

Разпределение на невключените в Насоки за кандидатстване средства по ПТП – 6.1 млн. евро



Процедури със значителни недоговорени средства


към 01 ноември 2026 г. | в евро

Проект, бенефициент	Програми-рани	Догово-рени	Недого-ворени	Бележка
BG16RFTA001-1.003-0001, „Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС“, ЦКЗ	17 644 172	7 093 874	**10 550 298**	Допълнителни дейности на ЦКЗ за ~10.5 млн. евро, в т.ч. изграждане на обучителен център за ИСУН в Комплекс „Бояна“ (6.93 млн. евро).
BG16RFTA001-1.003-0002, „Разработване на електронен център за държавните помощи и подкрепа на работата на Националния орган по държавните помощи във връзка с управлението на средствата от ЕФСУ“, МФ	940 777	607 490	**333 287**	Обществената поръчка за разработване на ЕЦДП е обявена на 14.09.2026 г., предстои разглеждане на получените оферти.
BG16RFTA001-1.004-0001 „Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България“, ЦКЗ	22 471 278	21 398 019	**1 073 259**	Възнаграждения на служителите и изпълнение на функциите на ЦКЗ.
BG16RFTA001-1.004 втори финансов план	1 329 359	0	**1 329 359**	Предстои подаването на втори финансов по процедурата за извършване на три броя оценки по хоризонтални теми.
BG16RFTA001-1.005-0003 „Подкрепа при прилагането на по-ефективни мерки в областта на обществените поръчки“, АОП	3 997 474	3 101 851	**895 623**	—


Разпределение на договорените средства по групи бенефициенти

към 01 ноември 2026 г. |

По стойност

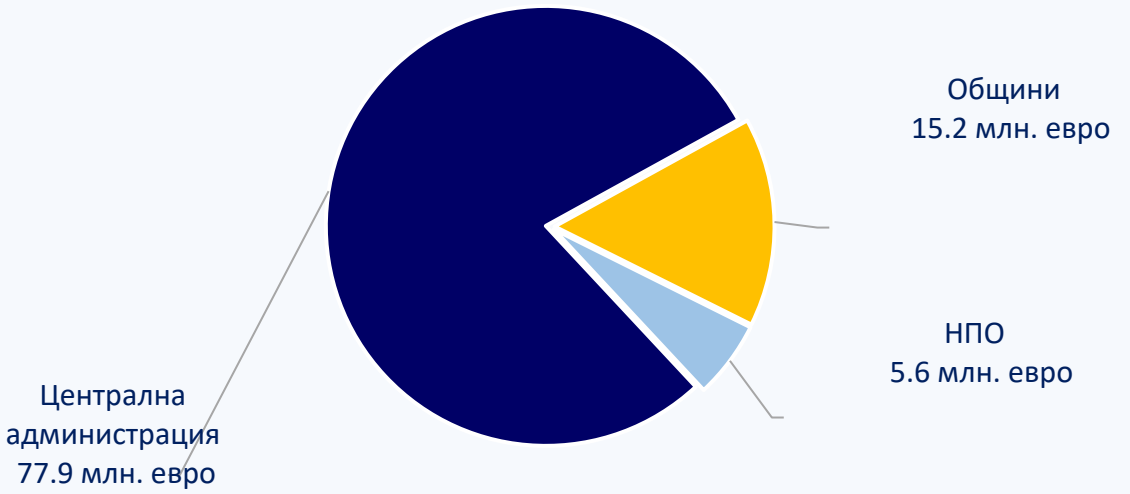

По брой договори

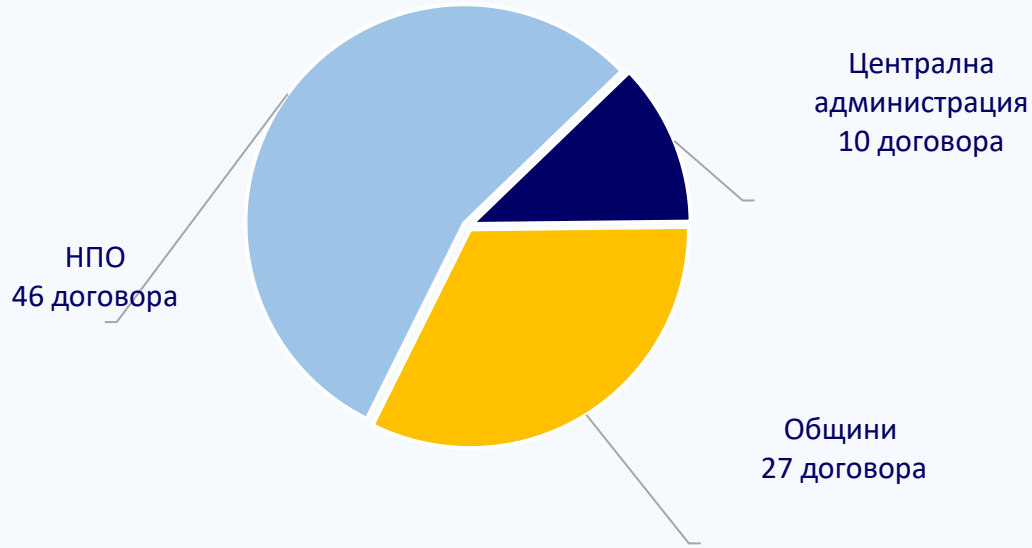

Съфинансирано от Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ
ПРОГРАМА

Финансово изпълнение

към 01 ноември 2026 г. | в млн. евро | общ бюджет

100%

Бюджет

121.5 млн. евро

31.5%

Изплатени средства

38.3 млн. евро

95.0%

Програмирани средства (НК)

115.4 млн. евро

27.2%

Верифицирани средства

33.1 млн. евро

81.3%

Договорени средства

98.7 млн. евро

22.1%


Заявени за плащане пред ЕК

26.8 млн. евро

Изпълнение на целта по правилото n+3 към 31.12.2026 г.

към 01 ноември 2026 г. | в млн. евро | европейско финансиране

Цел по правилото n+3	Заявени към ЕК (до 31.10.2026 г.)	Подаден ДИВ (07.10.2026 г.)	Верифицирани за ДИВ (октомври 2026 г.)	Прогноза за верификация (ноември 2026 г.)	Преизпълнение на целта
28.1 млн. евро	**22.2** млн. евро	**4.4** млн. евро	**0.8** млн. евро	**5.2** млн. евро	**+ 4.5** млн. евро

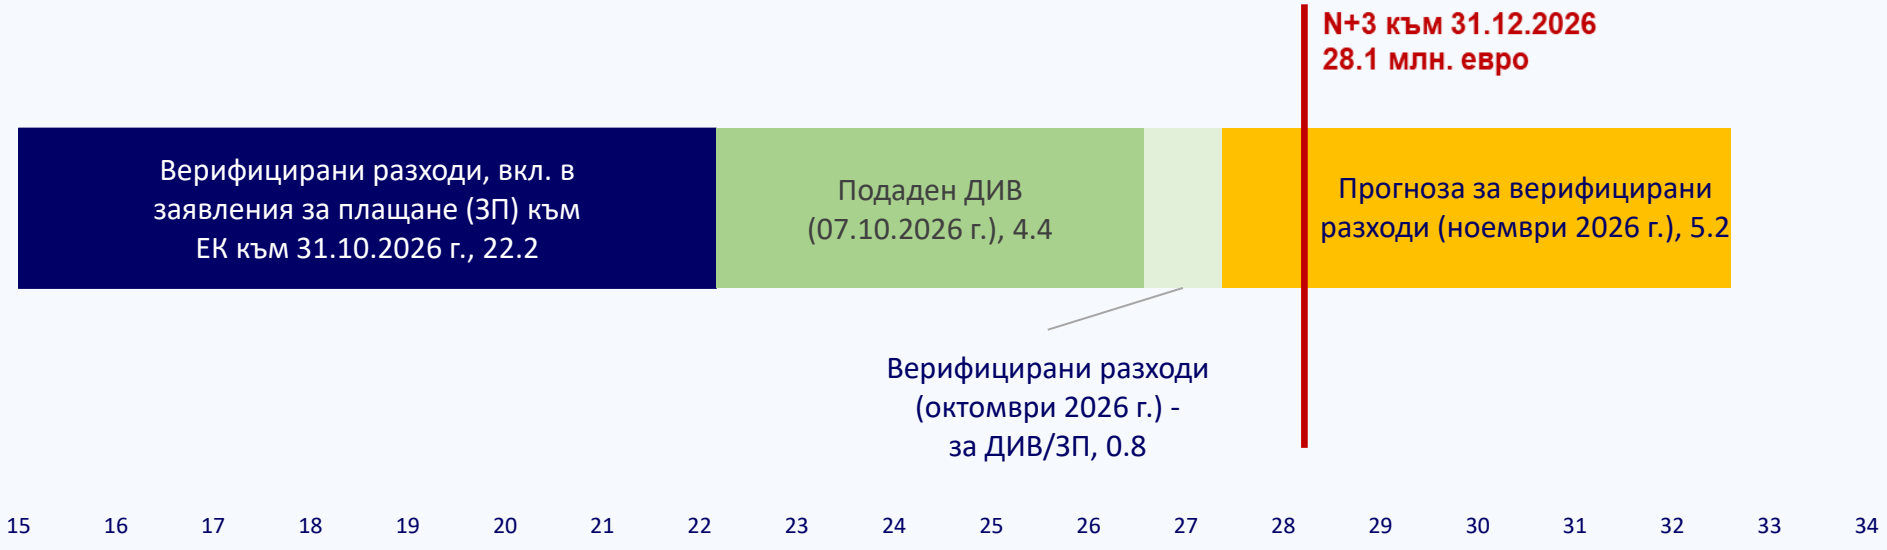

Изпълнение на целта по правилото n+3 към 31.12.2027 г. и 31.12.2028 г.

към 01 ноември 2026 г. | в млн. евро | европейско финансиране



ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАГУБА НА СРЕДСТВА

- Регулярен анализ на текущото изпълнение на сключените договори с цел оценка на напредъка;
- Интензивна комуникация и координация между УО, конкретните бенефициенти по Програмата, системния интегратор (ИО АД), отговорни институции, службите на ЕК и др.;
- Проактивно участие на УО на ПТП при предлагане на решения за промени, в резултат на извършван мониторинг на напредъка в изпълнение на дейности и индикатори;
- Инициране и провеждане на срещи с бенефициенти по повод на идентифицирани проблеми при изпълнението на дейности по проектите или бюджетните линии;
- Осъществяване на писмена комуникация при установени проблеми, включително за представяне на искания за плащане в определени срокове;
- Създаване на организация за навременно верифициране на постъпилите искания за плащане;
- Обсъждане на идеи за (над)договаряне.



BG16RFTA001-1.002-0001 | 01.02.2024 – 31.12.2029 | **4 087 212.72 евро**

Развитие на Академията за фондовете на ЕС

Бенефициент: Институт по публична администрация (ИПА)

Академията за фондовете на ЕС осъществява системен хоризонтален трансфер на знания към служителите в системата за управление на средствата от ЕС в България и към ключовите бенефициенти.

Каталози с обучения

3 годишни каталога са публикувани (2024, 2025, 2026) като са отчетени над **4 800 участия в обучения**.

Експертни мрежи

4 експертни мрежи са създадени в областта на:

- обществените поръчки
- финансовото управление
- данните и ИИ
- мерките за публичност и комуникация

12 събития с над **780 участници**.

Майсторски клас на EIPA За първи път е проведен майсторски клас на EIPA за висши държавни служители, обхващащ бъдещите политики на ЕС, иновациите, лидерството и изкуствения интелект.

BG16RFTA001-1.003-0001 | 01.11.2023 – 31.12.2029 | **7 093 874.11 евро**

Дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС

Бенефициент: Централно координационно звено (ЦКЗ)

Изграден капацитет

1 262

обучени за работа със системата ИСУН

Оптимизирана е базата данни на ИСУН, реализирани са **19 нови функционалности**, извършена е миграция на СУНИ в ИСУН, политиките за информационна сигурност са актуализирани в съответствие с актуалните стандарти.

Намаляване на административната тежест

над 50%

Административната тежест за програмен период 2021-2027 г. е намалена в сравнение с програмен период 2014-2020 г.

Кандидати

по-нисък среден брой документи, изисквани за процедура

Бенефициенти

значително намаление на средния брой декларации, изисквани за пакет отчетни документи

Съфинансирано от Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРОГРАМА



BG16RFTA001-1.004-0001 | 01.11.2023 – 31.12.2029 | **21 398 019.06 евро**

Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване

Бенефициент: Централно координационно звено (ЦКЗ)

30

Стратегически резултати

30 анализа и стратегически документа са изготвени, заедно с **10 методически указания** и проекти на законодателни актове за укрепване на рамката на политиката на сближаване.

3

Обучителни модули

3 хоризонтални обучителни модула са разработени за Академията за фондовете на ЕС, като **19 служители на ЦКЗ** са преминали пряко обучение.

2 708 669

Комуникационен обхват

2 708 669 импресии в социалните медии, повишаващи осведомеността за резултатите от политиката на сближаване сред широката общественост.

BG16RFTA001-1.005 | 01.11.2023 – 31.12.2029 – ИА ОСЕС и Национален фонд | 01.11.2023 – 31.12.2029 – АОП | **30 108 711.56 евро**

Процедура: По-висока добавена стойност на системата за управление на средствата от ЕФСУ

Бенефициенти: ИА ОСЕС · Дирекция „Национален фонд“ · Агенция по обществени поръчки

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС)

6	аналитични доклада изготвени
4	методически указания подготвени
617	одита извършени

Дирекция „Национален фонд“ (НФ) – Министерство на финансите

6	методически указания / проекти на законодателни актове
313	проверки и контроли извършени

Агенция по обществени поръчки (АОП)

10	методически указания разработени
489	предварителни контрола на процедури за обществени поръчки, финансирани със средства от ЕС

Развитие на капацитета

756	Служители, обучени на национално и международно ниво
8	тематични обучителни модула, разработени и предоставени чрез Академията за фондовете на ЕС

Съфинансирано от Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРОГРАМА



BG16RFTA001-1.006 | 01.01.2024 – 31.12.2029 | **15 188 390.96 евро**

Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България

Бенефициент: 27 общини – областни центрове

27

Мрежата от **27 областни информационни центъра (ОИЦ)** продължава да функционира ефективно в цялата страна и е основен посредник между политиката на сближаване на ЕС и гражданите, общините и местните заинтересовани страни.

Видимост и комуникация

Подобрена видимост и целенасочена комуникация относно политиката на сближаване на ЕС, наличните възможности за финансиране и осезаемите резултати от проектите във всичките 27 области.

Последващи действия по плана за действие

Официално изпълнение на плана за действие от оценката на мрежата от 27 ОИЦ една година и половина след одобряването му. Управляващият орган ще свика нова среща с ЦКЗ, за да се обсъдят необходимите действия и следващите стъпки.

BG16RFTA001-1.007-0001 | 01.07.2024 – 31.12.2027 | **3 646 814.91 евро**

УСПЕХ - умения, синергия и партньорства за европейски хоризонти

Бенефициент: Национално сдружение на общините в Република България

Експертна подкрепа за общините

51 заявления за експертна подкрепа са изпълнени

83 допълнителни заявления в момента се изпълняват

Всички мерки за подкрепа са възложени на външни изпълнители с ясно определени обхват, резултати и срокове.

Ангажиране и информираност

10 **дискусионни форума** проведени с **1 558 участници** – представители на общините и регионалните заинтересовани страни от цяла България.

3 **учебни посещения,** проведени с **85 участници**, даващи възможност за взаимно учене и обмен на добри практики с колеги от ЕС.

Съфинансирано от Европейския съюз
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРОГРАМА



BG16RFTA001-1.009-0001 | 01.01.2024 – 31.12.2027 | **263 826.61 евро**

Оптимизиране на държавната политика по отношение на превенцията и откриването на нередности, измами и корупция при проекти, съфинансирани със средства от ЕС

Бенефициент: Министерство на вътрешните работи – дирекция АФКОС

Проверки на място

43

31 проверки на място в рамките на административни разследвания и 12 проверки **съвместно с ОЛАФ**, което засилва възможностите за откриване и трансграничната координация в борбата с измамите.

Аналитично отчитане

5

5 аналитични доклада, изготвени за Съвета на АФКОС, предоставящи стратегическа информация за тенденциите по нередности и системните рискове в проекти, финансирани от ЕС.

Институционален капацитет

Административният капацитет е засилен чрез кръгла маса с представители на Съвета на АФКОС и годишна работна среща на служителите по нередности от управляващите органи.



BG16RFTA001-1.009-0002 | 01.01.2024 – 30.06.2027 | **168 726.32 евро**

Управление на Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ (НРПД)

Бенефициент: Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

Техническа спецификация

Разработена техническа спецификация за междинна оценка на ефективността на мерките на НРПД и концепция за провеждане на обученията в България и в ЕС.

Обществена поръчка

Обявена е ОП предмет "Междинна оценка на ефективността на мерките от НРПД и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет на отдел „Натура 2000“. Получени са 4 бр. оферти. Предстои сключване на договор.



BG16RFTA001-1.010

01.04.2026 – 28.02.2027

1 975 413,22 евро

Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България

45

сключени договори

5

с приключило изпълнение

40

в изпълнение

45 **Проведени обучения по хоризонтални теми**

3 **Проведени мероприятия с представители на заинтересованите страни**

Проблеми и мерки – ЦКЗ (BG16RFTA001-1.003 и 1.004)

Бенефициент: Централно координационно звено

Недостатъчно усвояване на бюджета

От 17.6 млн. евро, разпределени на ЦКЗ по процедура 1.003, са **договорени само 7.09 млн. евро** (БЛ за ИСУН). Предложеното от УО намаление на бюджета с 10 млн. евро не беше подкрепено поради планирани допълнителни дейности на ЦКЗ за ИСУН и изграждане на обучителен център.

Проведена е кореспонденция с ЦКЗ през март – юни 2026 г. и са уточнени прогнозните срокове за изпълнение. За обучителния център е договорено след изпълнение на подготвителните дейности да се прецени възможността за приключване на СМР и плащанията до 31.12.2029 г. За останалите дейности предстои до 30.11.2026 г. да бъде подадено искане за изменение на БЛ.

Надграждане на Портала за ЕС фондове

Възлагането на надграждането на **www.eufunds.bg** се забавя **от 2025 г.** Техническите спецификации са подготвени, но тристранен договор (АМС, МИДТ и ИО АД) се подписа едва през м. октомври 2026 г. Очаква се обявяване на обществената поръчка от ИО АД.

Пътна карта за административния капацитет

Не е отчетен напредък по **Пътната карта за изграждане на административен капацитет за ЕСИФ/EFSM 2021–2027**. ЦКЗ не е финализирало или споделило документа **от 2023 г.**

Проблеми и мерки – ЦКЗ (продължение)

Пактове за почтеност · Цели за обучение · Финансово планиране

Пактове за почтеност – риск от непостигане

Ограничен напредък по националната методика за пактове за почтеност. Съответните документи са изготвени, но **не са споделени с всички заинтересовани страни от април 2025 г.**, което създава значителен риск от непостигане на индикатор **О3-3**. Необходими са незабавни действия за осигуряване на съгласуваност между заинтересованите страни и изпълнение.

Недостигане на целта за обучение (О2-2)

Само **19 от 417 целеви обучени лица** са постигнати до края на 2025 г. – едва **4,5% изпълнение**.

Предстоящо представяне на финансов план

Актуализираният **финансов план за 2026 г.**, очакван от **31 януари 2026 г.,** все още не е представен. Това остава неизпълнено административно задължение, което Управляващият орган продължава да следи.

Проблеми и мерки – Министерство на финансите (МФ) и УО на ПТП

BG16RFTA001-1.003-0002 | 27.09.2022 – 31.12.2029

607 489.72 евро | **МФ (ДИР. „ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И ПОЛИТИКИ“)**

Хъб за държавни помощи за ЕФСУ

Стартирането на обществената поръчка за създаване на Хъба за държавни помощи **е забавено с една година.**

На 03.08.2026 г. е подписано тристранно споразумение между МИДТ, Министерство на финансите и „Информационно обслужване“ АД за възлагане на изпълнението от системния интегратор чрез провеждане на процедура по реда на ЗОП.

Обществената поръчка е **обявена на 14.09.2026 г.** и е на етап оценка на подадените оферти.

BG16RFTA001-1.001-0001 | 08.11.2023 – 31.12.2029

14 194 485.21 евро | **УО НА ПТП**

Сграда Необходим е ремонт, за да отговаря сградата на съвременните стандарти за безопасност, работна среда и промяна на предназначението (процесът е започнат през 2007 г.).

Проектирането е завършено и **разрешението за строеж е влязло в сила**. Предстои актуализиране на КСС и техническата спецификация и подготовка на документацията за обществената поръчка.

Резервен вариант: При неосъществяване на строителството **3.2 млн. евро** следва да бъдат пренасочени към други дейности/проекти.

Проблемът за ремонта на сградата се адресира и по отношение проекта на ИПА - BG16RFTA001-1.002-0001.

Индикатори на програмата – преглед на напредъка

Верифицирани стойности към 1 ноември 2026 г. спрямо договорените цели за 2029 г.

Индикатор	Цел 2029	Договорена цел	Верифицирана стойност	Статус
О1-1 Аналитични доклади и стратегически документи	66	48	42	✓
О1-2 Хоризонтални и междусекторни оценки	10	3	1	▲
О1-3 Методически указания и проекти на нормативни актове	44	41	30	✓
О1-4 Проверки и одити, извършвани от одитиращи и/или контролни органи	1 719	1 367	1 459	✓
О1-5 Дял на процедурите, преминали предварителен контрол от АОП, по които няма наложена финансова корекция за нарушения в подготвителната фаза (%)	94%	94%	95,69%	✓
О1-7 Нови функционалности на ИСУН	75	75	19	▲
О1-8 Намалена административна тежест за кандидатите (%)	30%	30%	51,19%	✓
О1-9 Намалена административна тежест за бенефициентите (%)	40%	40%	69,69%	✓
О2-1 Хоризонтални модули за обучения	94	78	46	▲
О2-2 Обучени лица / служители	19 518	20 181	7 584	▲
О2-3 Дял на обучените лица/служители, преминали успешно тест за усвоени знания (%)	80%	80%	84,18%	✓
О2-5 Общини с повишен капацитет	60	70	29	▲
О3-3 Пактове за почтеност	**3**	**0**	**0**	●
О4-1 Обществени консултации, медиации и презентации	2 348	2 769	1 503	✓
О4-3 Импресии в социалните мрежи и платформи	2 160 000	7 479 850	7 479 850	✓
О4-4 Ниво на информираност за програмите от СП (%)	62%	62%	0	▲
О4-5 Сесии на eufunds.bg	2 400 000	2 400 000	0	▲
О4-6 Гледания (views) в социалните мрежи и платформи	6 912 000	13 847 000	22 641 683	✓

Индикатор О3-3 (Пактове за почтеност) е с най-висок риск от непостигане и изисква незабавно внимание.

Проверени процедури за обществени поръчки, нередности и съдебни дела

25

Проверени процедури

Общ брой проверени процедури за обществени поръчки по Програма „Техническа помощ“

20

Проверени без нарушения

Процедури, проверени без финансова корекция

5

Финансови корекции

Процедури, по които са наложени финансови корекции; общият размер на корекциите е **10 873.87 евро**



Текущи одити от Одитния орган в УО

Втори системен одит: 14.04 – 31.08.2026 г.

КИ 7 Мерки за борба с измамите
КИ 8 Декларация за управлението

Статус: Приключил, няма получен предварителен одитен доклад

Втори одит на операциите: 14.04 – 31.12.2026 г.

КИ 2 Критерии и процедури за подбор на операции
КИ 3 Информация за условията за подкрепа
КИ 4 Проверки на управлението
КИ 5 Ефективна система за съхранение на документи за одитна проследимост
КИ 9 Законосъобразност и редовност на отчетените разходи

Първи период: декларирани разходи в периода 1.07.2025 – 25.03.2026 г.
Статус: Приключил, няма получени предварителни одитни доклади

Втори период: декларирани разходи в периода 26.03 – 30.06.2026 г.
Статус: в процес на изпълнение
